


福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部 建屋瓦礫の撤去完了について


4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事は、平成23年11月26日に着手し、原子炉建屋オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上部の屋根・柱・梁等の建屋瓦礫の撤去を進めて参りました。

平成24年4月下旬からは、新たにオペフロ上に建屋瓦礫撤去用の有人小型重機を設置し作業を進め、7月11日に作業が完了しました。

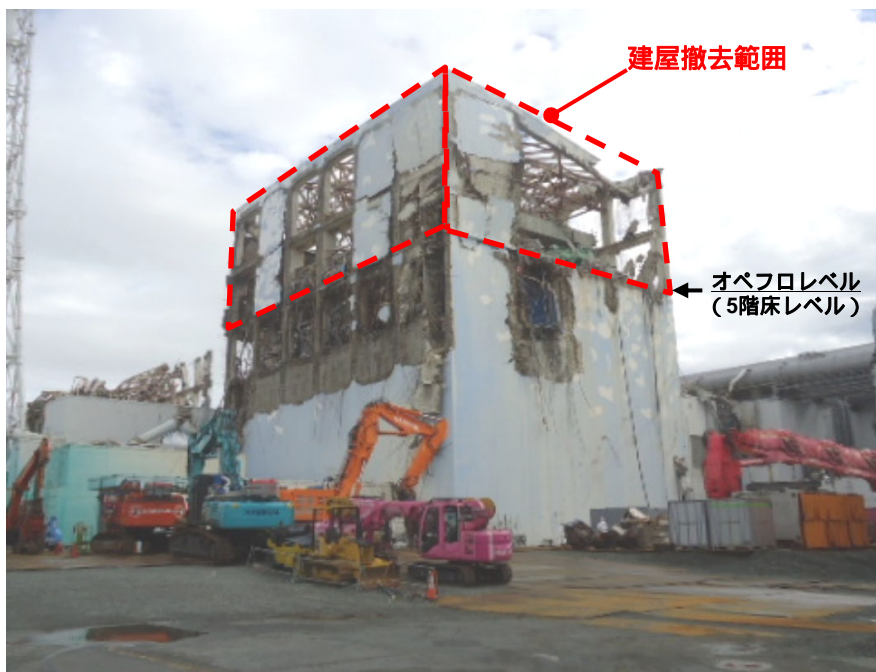

建屋瓦礫 撤去工事 着手前 [南西面]

撮影日：平成 23年 9月22日

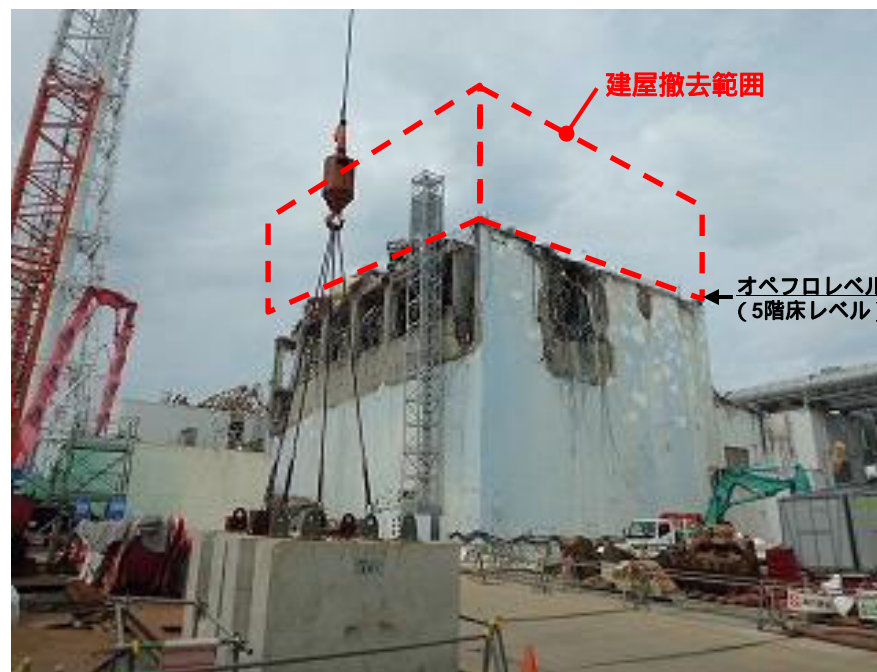

建屋瓦礫 撤去工事 完了後 [南西面]

撮影日：平成 24年 7月 5日

福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部 建屋瓦礫の撤去完了について

今後は、オペフロ上にある大型機器（原子炉格納容器・原子炉圧力容器の蓋）等の撤去を7月下旬～10月に実施すると共に、燃料取り出し用カバーの設置工事を進めて参ります。



使用済燃料プール防護構台設置状況

撮影日:平成 24年6月15日



建屋瓦礫 撤去工事 完了後 [オペフロ上部:西面]

撮影日:平成 24年7月9日
